

One Pager – Statusbericht 1 · Sprint 1

Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1

Verteiler:
Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) | Prof. Dr.-Ing. D. Pähler (Auftraggeber) | Projektteam

Zielsetzung Gesamtvorhaben:

Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein reales Bauteil mit mindestens einem Kern im Handformverfahren sicher herstellen.


Aktueller Projektstatus

GELB
20 h Übertrag in Sprint 2,
AG-Einbindung 3,0 von 6

Abschlussstermin: 04.10.2026
Statusbericht vom: 30.08.2026
Restlaufzeit: 5 Wochen (Sprint 4 endet 27.09.2026)
Nächster Meilenstein: Probeabguss bis 06.09.2026

Sprintziel	Aufgaben erledigt	Aufwand abgebaut	Übertrag in Sprint 2	Auslastung Sprint 1	Weiches Kriterium
3 von 3 Bedingungen	11 von 12	123 von 143 h	20 h (1 Aufgabe)	98 % (143 / 146 h)	grün (9-12 Ereign./Wo.)

Leistungsfortschritt - Burndown Sprint 1

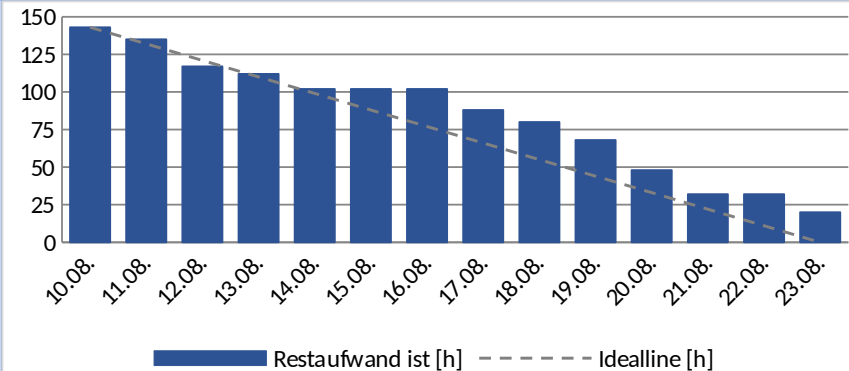


Aktuelle Ergebnisse - Abschluss Sprint 1

- Sprintziel in allen drei Bedingungen erreicht (Stand 23.08.2026).
- V-F1: reproduzierbare Sandrezeptur (Vogelsand + Speiseöl) dokumentiert.
- V-W1: Aufheizkurve und Gießtemperaturfenster für Reinzinn mit Thermoelement Typ K gemessen.
- Bauteil am 17.08. von Prof. Pähler freigegeben: Stehbuchse mit Fußplatte.
- Formkästen vermessen, Nabertherm-Ofen (5,5 kW) dokumentiert, Ausstattung Göpfert <-> FTT-Labor gegenübergestellt. GPM-Abgaben am 12.08. raus.

Besondere Hindernisse

- Der bis zum 10.08. verfolgte Bauteilentwurf war nicht aushebbar - der Querschnitt nimmt mit dem Abstand zur Teilungsebene zu. Konstruktion bis zur Freigabe am 17.08. blockiert.
- Folge: parametrisches CAD-Modell (20 h) nicht abschließbar. Kein Teilfortschritt abgebucht, die Aufgabe geht vollständig in Sprint 2.

Team-Management-Barometer (Skala 1-6)

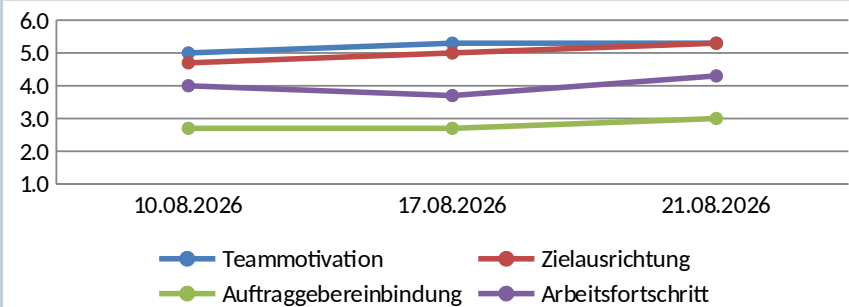

Nächste Schritte - Sprint 2 (24.08. - 06.09.2026)

- Sprintziel: Modell, Kernkasten und Kern sind gefertigt, der erste Probeabguss ist gelaufen.
- CAD-Modell in zwei Pakete geteilt (Bauteil + Kern 12 h / Kernkasten + Modell 10 h), startet als erstes Arbeitspaket.
 - Gefährdungsbeurteilung vorgezogen - Voraussetzung für die HAW-Freigabe.
 - Vorversuche V-K1 (Kern), V-S1 (Schwindmaß), V-T1 (Trennmittel).

Aktuelle Risiken

- 1 Transfer Göpfert -> HAW: in Heide erprobte Rezeptur und Parameter gelten nicht automatisch am HAW-Ofen (W 3 x H 3 = 9).
- 2 Formstoff ungeeignet oder von Charge zu Charge schwankend (W 2 x H 3 = 6).
- 3 Gefährdungsbeurteilung zu spät -> blockiert die Laborfreigabe.

Bearbeitete User Stories

US	Inhalt	Status
US-04	Form- und Kernsand nach fester Rezeptur ansetzen	erfüllt (V-F1)
US-05	Gusswerkstoff mit Laborausstattung aufschmelzen	erfüllt (V-W1)
US-01	Zweiteilige Form mit Kern selbst einformen	in Arbeit – CAD offen

Die übrigen drei User Stories (US-02, US-03, US-06) starten mit dem Probeabguss in Sprint 2/3.

Maßnahmen

- 1 Bei jedem Vorversuch Ofentyp, Leistung, Tiegel, Absaugung und Werkzeuge festhalten und mit der Ausstattung im FTT-Labor abgleichen. (Jonas Gebert)
- 2 Rezeptur und Sandmarke im Versuchsskript festschreiben, Ölsand als Ersatz. (Fynn Barmwater)
- 3 Gefährdungsbeurteilung in Sprint 2 vorziehen, HAW-Vorlage und G1-G10. (Paul Wattering)
- 4 Terminanfrage an den Auftraggeber ab sofort am ersten Sprinttag. (Fynn Barmwater)

Projektfortschritt (Ablaufplan Variante B) - heute: 30.08.2026

Sprint 1 10.08. - 23.08.	Sprint 2 24.08. - 06.09.	Sprint 3 07.09. - 20.09.	Sprint 4 21.09. - 27.09.	Puffer & Abgabe 28.09. - 04.10.
abgeschlossen - Ziel erreicht	läuft <- heute	geplant	geplant	Abgabe 04.10.2026

Unterschrift Auftraggeber:in: _____

tering (Scrum Master) - Stand 30.08.2026 - HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften
