


GPM – Grundlagen Projektmanagement

Teil vom Modul Bachelorprojekt

**„Lernen und
direkt im Projekt anwenden.“**

Organisation

Ihre Professorin im Sommerkurs 2026:
Prof. Dr. Birgit Koeppen

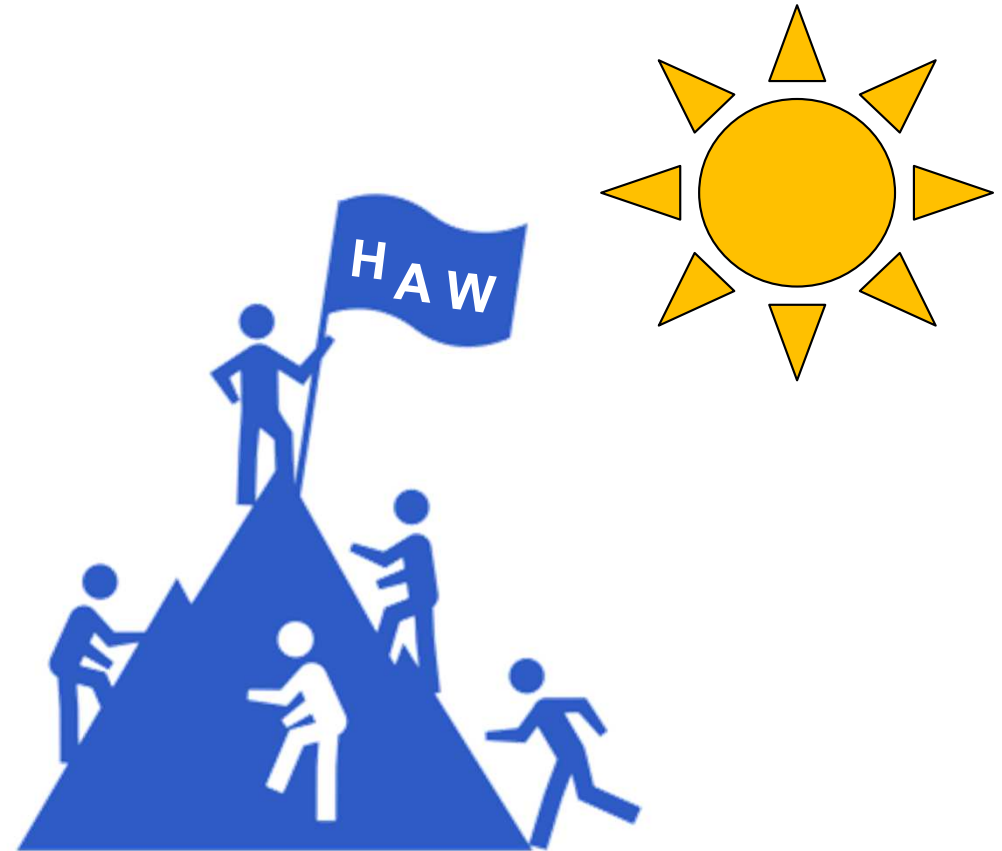

Struktur der GPM-Vorlesung

Die GPM-Vorlesung und das Bachelor-Projekt bilden eine Einheit.

Teil 1	Teil 2	Teil 3	Teil 4
1. Einleitung • Ablauf Bachelorprojekt und GPM • Erwartungen 2. Methoden des PM • Definition Projektmanagement • Agiles vs. klassisches PM • Scrum-Methodik • User Stories 3. Kommunikation im Team • Kommunikationsquadrat • Feedback • Teamregeln	1. Vorstellung der Projektteams 2. Projektplanung • Ablaufplan • Daily/Weekly • Product-/Sprint-Backlog • Sprint + Sprint Review + Retrospective • Task Board 3. Risikomanagement • Risikoanalyse/-matrix	1. Rollen im Team • Funktionen und Rollen • Scrum Master 2. Motivation und Gruppendynamik • Motivationskurve • Teammanagement-Barometer 3. Projektcontrolling • Regelkreis • Burndownchart • Weiche Messgrößen • One Pager	1. Ergebnisse und Lessons Learned • Diskussion der Methoden-anwendung • Lessons Learned für zukünftige Projekte

Die Teile 1 bis 3 schaffen das **methodische Grundwissen**. Teil 4 prüft die **Anwendung**.

Bachelor-Projekt und Vorlesung Grundlagen des Projektmanagements

Das Bachelor-Projekt ...

- wird parallel zur Pflichtvorlesung GPM bearbeitet.
- hat eine Teamgröße von 3 bis 5 Personen.
- wird mit Projektmanagement-Methoden (entsprechend GPM) geführt und begleitet.
- wird vor Ort fachlich und organisatorisch unterstützt durch eine:n Betreuer:in.
- wird zum Abschluss professionell präsentiert.

Offizielle Anmeldungen und Prüfungsform

- Jede:r Studierende muss 2 offizielle Anmeldungen vornehmen:
 1. zur Vorlesung GPM
 2. zum Bachelor-Projekt
- Jeweils auf die richtige Gruppe achten.
- Nachmeldungen sind ausgeschlossen!
- Das Bachelorprojekt und die GPM-Vorlesung werden über eine Portfolio-Prüfung bestehend aus folgenden Teilen abgeprüft:
 - Projekt (= Bachelorprojekt)
 - Zwei Hausarbeiten (= Statusberichte)
 - Semesterbegleitende Übungsaufgaben mit Abgabe
 - Teamregeln
 - Aufgabenstellung
 - Ablaufplan
 - Semesterbegleitende Übungsaufgaben als Hörsaalübungen

Ablauf der GPM-Vorlesung

Aus der Prüfungsform ergeben sich folgende Anforderungen:

- Die Hörsaalübungen werden während der GPM-Vorlesung bearbeitet, daher wird eine Teilnahme an allen GPM-Terminen grundsätzlich erwartet.
 - Versäumte Übungsaufgaben bzw. Vorlesungen müssen nachgearbeitet werden. Der Nachweis des Nacharbeitens erfolgt je nach Umfang in Form einer Rücksprache und/oder einer Ausarbeitung.
- Eine aktive Teilnahme an der Vorlesung und insb. bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben wird erwartet.

⇒ **Bei Unklarheiten, egal ob inhaltlich oder organisatorisch, bitte rechtzeitig Fragen stellen!**

Bewertung

- Beide Statusberichte und die drei Hausaufgaben müssen bestanden werden.
- Die Bewertungsstufen der Berichte und Hausaufgaben sind „bestanden“, „Wiedervorlage“, „nicht bestanden“
 - In der Regel ist eine Wiedervorlage pro Bericht bzw. pro Hausaufgabe möglich.
- Sie erhalten insb. zu den Berichten ein detailliertes Feedback, was gut ist bzw. was zu verbessern ist.
 - In den Statusberichten darf keine Aufgabe (Kapitel) vollständig fehlen.

Die Bewertung „nicht bestanden“ für einen der Statusberichte oder eine der Hausaufgaben bedeutet das Nicht-Bestehen des gesamten Projektteams für GPM

- Mit Ihrer Unterschrift auf dem Bericht oder der Aufgabe, bestätigen Sie, dass Sie mit dem Inhalt einverstanden sind.
- Wenn Sie dem eingereichten Inhalt nicht zustimmen können, kontaktieren Sie mich vor der Abgabe.

Projektmanagement bedeutet Kommunikation,

d.h. kommunizieren Sie bei Problemen rechtzeitig und verlässlich innerhalb des Teams, mit dem/der Projektbetreuer:in und mit der GPM-Betreuerin, dann ist ein „nicht bestehen“ in der Regel vermeidbar.

Formales zu den Statusberichten

Erstellung eines gemeinsamen Berichts pro Projektteam

- Verwendung der vorgegebenen Struktur für den Statusbericht
- Jedes „normale“ Team-Mitglied betreut mindestens eine Methode und das zugehörige Kapitel des Statusberichts
- Der Scrum Master koordiniert bzw. betreut alle anderen Methoden und Kapitel.
- Die Zuordnung wird unter „Team-Organisation“ genannt.
- Folgende Methoden sind zuzuordnen:
 - Kap. 2.1.2: Aktuelles Task Board (inkl. Sprintbacklog und Product-Backlog)
 - Kap. 2.2.1: Burn down Chart
 - Kap. 2.2.2: Team-Management-Barometer
 - Kap. 2.2.3+Kap.2.3.1: Weiches Kriterium und One Pager
- Abgabe als pdf-Format und per Mail
 - Dateiname: GPM_SK26_Status1_Gruppe3_Version1.pdf
- Abgabetermin wird für jede Gruppe individuell anhand des Ablaufplans des Projekts festgelegt
- **Unterschrift (elektronisch oder gescannt) aller Teammitglieder auf dem Deckblatt**

Inhalt von Statusbericht 1

Deckblatt *(Bericht von allen Teammitgliedern unterschrieben)*

Kap. 1: Projektbeschreibung und Projektteam

Kap. 1 am Beginn des Projekts erstellen

1.1 Projektbeschreibung

1.1.1 Aufgabenstellung *(von Auftraggeber:in und Teammitgliedern unterschrieben)*

1.1.2 User Stories

1.2 Ablaufplan

1.3 Projektteam

1.3.1 Team-Organisation

1.3.2 Team-Regeln

1.4 Risikomatrix inkl. Maßnahmen

Kap. 2: Sprint 1

Kap. 2.1 im Sprint Planning Meeting erstellen

2.1 Beginn des Sprints

2.1.1 Sprintziel

2.1.2 Aktuelles Task Board

2.2 Während des Sprints

*Kapitel 2.2.1 kontinuierlich aktualisieren
(Graphik neu für jeden Sprint)*

2.2.1 Burn down Chart

2.2.2 Team-Management-Barometer

2.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

*Kapitel 2.2.2+2.2.3 im Daily/Weekly aktualisieren
(Graphik des letzten Sprints fortsetzen)*

2.3 Ende des Sprints

2.3.1 One Pager *(von Auftraggeber:in unterschrieben)*

2.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Kap. 2.3 im Sprint Review bzw. Sprint Retrospective Meeting ausfüllen

Inhalt von Statusbericht 2

Deckblatt (*Bericht von allen Teammitgliedern neu unterschrieben*)

Kap. 1: Projektbeschreibung und Projektteam

Wenn sich während des Projekts Änderungen gegenüber Kap. 1 des ersten Statusberichts ergeben haben, so ist dieses hier explizit anzugeben und zu erläutern

Kap. 2: Sprint 2 *Struktur wie bei Sprint 1 für jeden neuen Sprint übernehmen*

2.1 Beginn des Sprints

2.1.1 Sprintziel

2.1.2 Aktuelles Task Board

Kap. 2.1 im Sprint Planning Meeting erstellen

2.2 Während des Sprints

2.2.1 Burn down Chart

2.2.2 Team-Management-Barometer

2.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

*Kapitel 2.2.1 kontinuierlich aktualisieren
(Graphik neu für jeden Sprint)*

*Kapitel 2.2.2 +2.2.3 im Daily/Weekly aktualisieren
(Graphik des letzten Sprints fortsetzen)*

2.3 Ende des Sprints

2.3.1 One Pager (*vom Auftraggeber:in unterschrieben*)

2.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Kap. 2.3 im Sprint Review bzw. Sprint Retrospective Meeting ausfüllen

Kap. 3: Sprint 3

...

Kap. n: Sprint n

Zur Verfügung stehende Ressourcen

Materialbestellungen stellen ein großes Projektrisiko dar.

- **Bestellungen sind nur auf Rechnung möglich:** Prüfen Sie, ob der ausgewählte (Online-)Shop dieses anbietet. Ggf. benötigen Sie vor der Bestellung explizite Angebote. Klären Sie auch, ob es Rahmenverträge mit einzelnen Firmen gibt.
- **Bestellungen dauern Zeit:** Das eigentliche Bestellen kann bis zu vier Wochen (!) dauern. Berücksichtigen Sie dieses bei Ihrer Projektplanung und in Ihrer Risikoanalyse.
- **Budget für Projekt klären:** Klären Sie frühzeitig, wieviel Budget Ihnen zur Verfügung steht
- Sprechen Sie rechtzeitig mit Projektbetreuer:in bzw. zuständigen WiMis des Instituts.

Werkstätten der HAW stehen Ihnen offen:

- 3D-Space für 3D-Druck aus Kunststoff im BT21.
<https://www.haw-hamburg.de/nachhaltige-ingenieurwissenschaften/laborzentren/3dspace/>
- Zentrale Laborwerkstatt für insb. spanende Bearbeitung aus Holz oder Metall im BT 5
<https://www.haw-hamburg.de/nachhaltige-ingenieurwissenschaften/laborzentren/zentrale-laborwerkstatt/>
- Maker Space zum Löten bspw. für Arduinos im BT7, 08.65.
<https://www.haw-hamburg.de/elektro-medien-und-informationstechnik/labore/makerspace/>
- Auch für 3D-Space und Laborwerkstatt ist eine offizielle Bestellung / Beauftragung notwendig.

MS Project mit Hochschullizenz kostenlos verfügbar

- auf den Rechnern in den PC-Räumen oder über Office 365
